Bezirk Schwyz
Sanierung Verbindungsstrasse Steinerstrasse
Abschnitt Schwyzerstrasse Dorfbrücke bis Wilerbach

Bauprogramm Submission

Käppeli Strassen- und Tiefbau AG Schwyz

Version 1.0
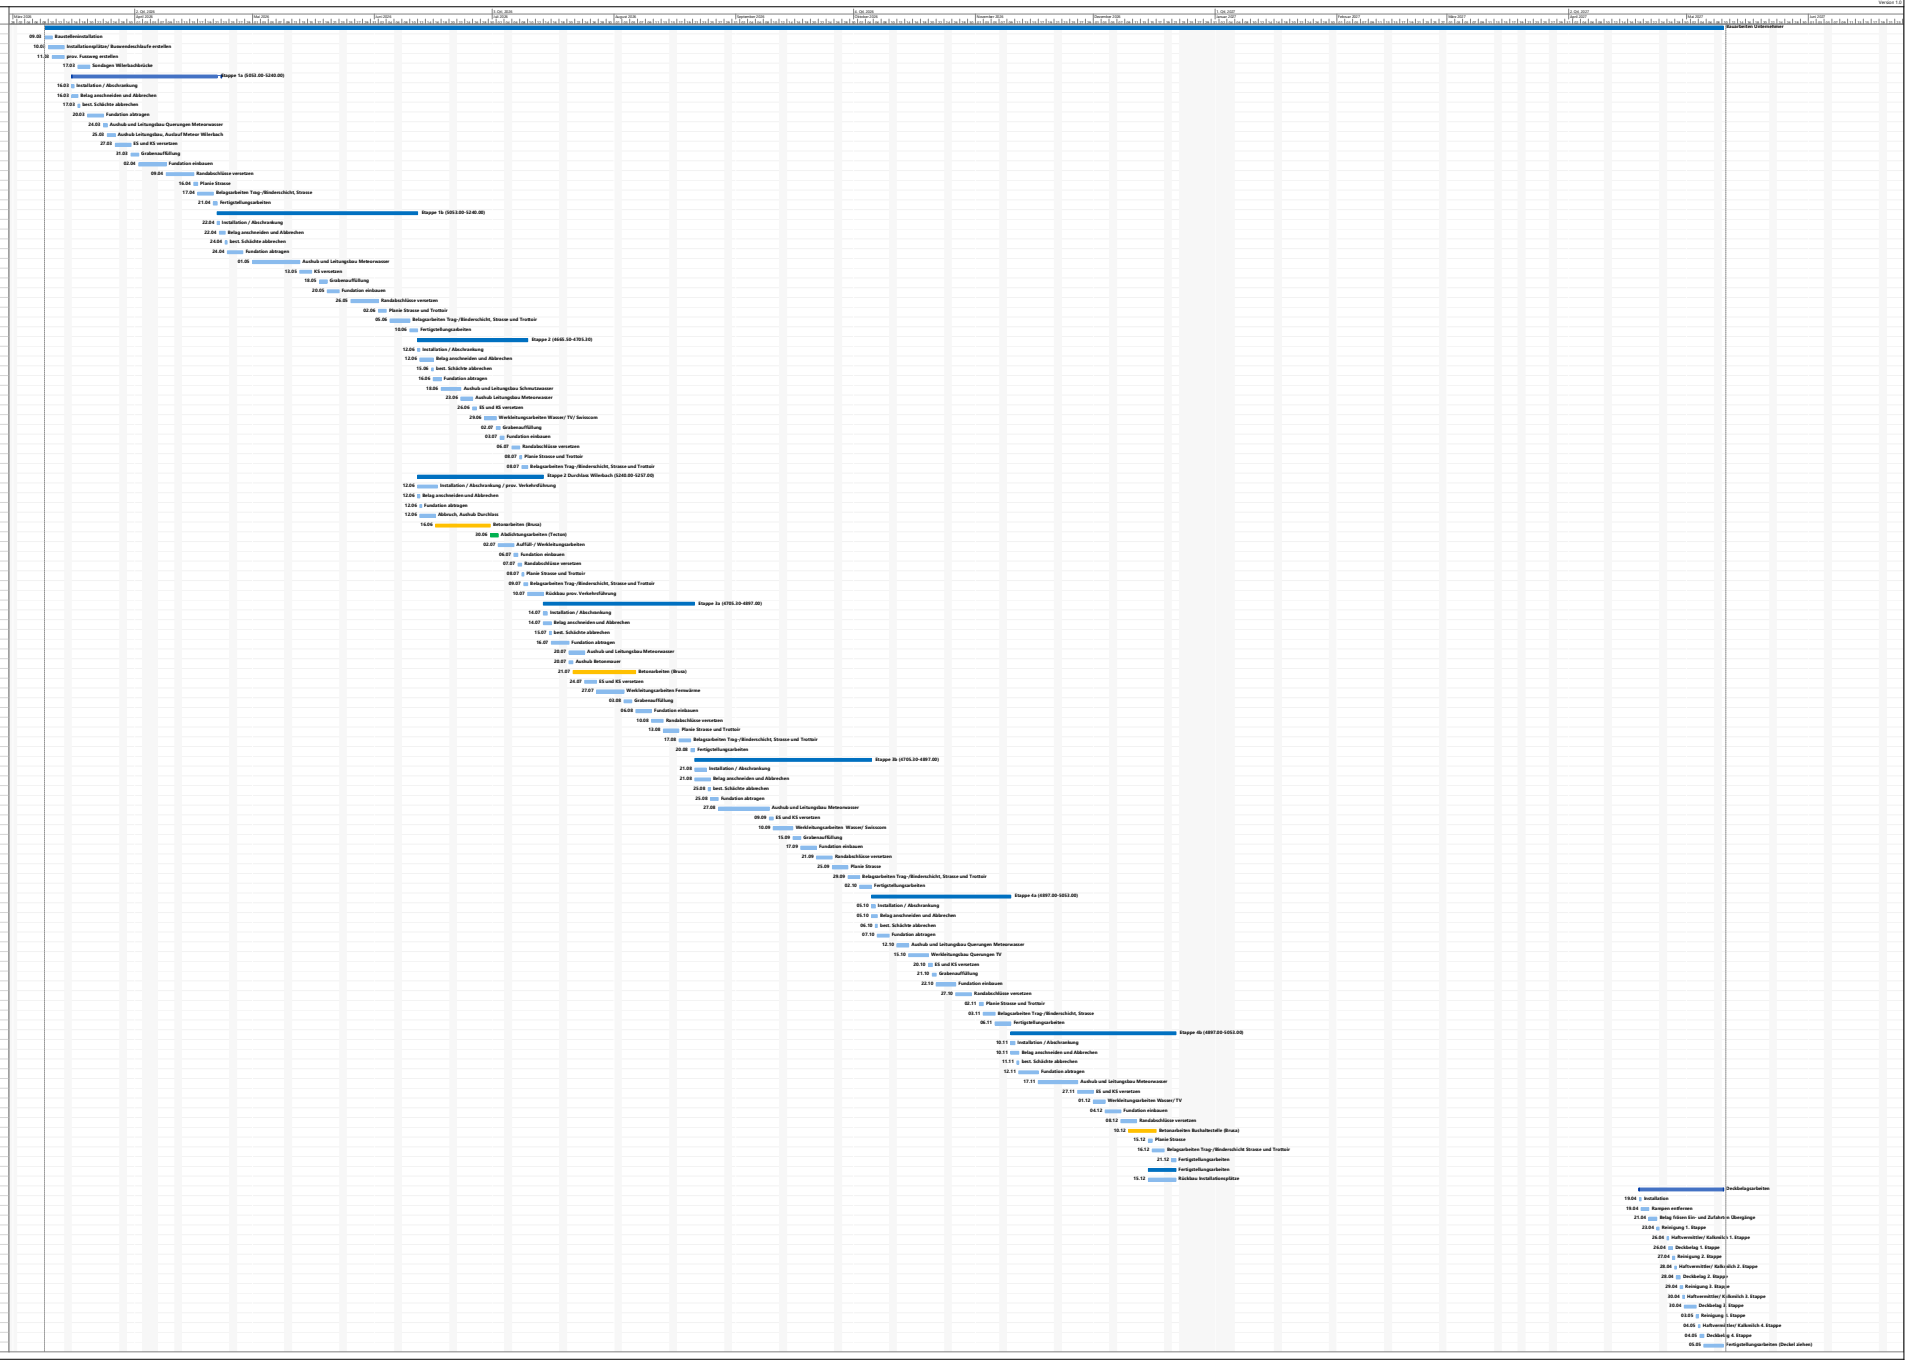
Nr.	Eingangsnorm
1	**Baustellen Unternehmer**
2	Baustelleneinrichtung
3	Installationsplätze/ Rumwendeschlaufe erstellen
4	prov. Fussweg erstellen
5	Sondagen Wilerbachdecke
6	**Etappe 1a (500.10-1240.00)**
7	Installation / Abschrankung
8	Belag anschneiden und Abbrechen
9	best. Schächte abbrechen
10	Fundation abtragen
11	Aushub und Leitungsbau Querungen Meteorwasser
12	Aushub Leitungsbau, Ausbau Meteor Wilerbach
13	ES und KS versetzen
14	Grabenauffüllung
15	Fundation einbauen
16	Randabschlüsse versetzen
17	Planie Strasse
18	Belagsarbeiten Trag-/Binderschicht, Strasse
19	Fertigstellungsarbeiten
20	**Etappe 1b (1053.00-1240.00)**
21	Installation / Abschrankung
22	Belag anschneiden und Abbrechen
23	best. Schächte abbrechen
24	Fundation abtragen
25	Aushub und Leitungsbau Meteorwasser
26	KS versetzen
27	Grabenauffüllung
28	Fundation einbauen
29	Randabschlüsse versetzen
30	Planie Strasse und Trottoir
31	Belagsarbeiten Trag-/Binderschicht, Strasse und Trottoir
32	Fertigstellungsarbeiten
33	**Etappe 2 (1660.30-1705.30)**
34	Installation / Abschrankung
35	Belag anschneiden und Abbrechen
36	best. Schächte abbrechen
37	Fundation abtragen
38	Aushub und Leitungsbau Schmutzwasser
39	Aushub Leitungsbau Meteorwasser
40	ES und KS versetzen
41	Werkleitungsarbeiten Wasser/ TV/ Swisscom
42	Grabenauffüllung
43	Fundation einbauen
44	Randabschlüsse versetzen
45	Planie Strasse und Trottoir
46	Belagsarbeiten Trag-/Binderschicht, Strasse und Trottoir
47	**Etappe 2 Durchlass Wilerbach (5240.00-5257.00)**
48	Installation / Abschrankung / prov. Verkehrsführung
49	Belag anschneiden und Abbrechen
50	Fundation abtragen
51	Abbruch, Aushub Durchlass
52	Betonarbeiten (Bruss)
53	Abdichtungsarbeiten (Tecton)
54	Auffüll / Werkleitungsarbeiten
55	Fundation einbauen
56	Randabschlüsse versetzen
57	Planie Strasse und Trottoir
58	Belagsarbeiten Trag-/Binderschicht, Strasse und Trottoir
59	Rückbau prov. Verkehrsführung
60	**Etappe 3a (4705.30-4897.00)**
61	Installation / Abschrankung
62	Belag anschneiden und Abbrechen
63	best. Schächte abbrechen
64	Fundation abtragen
65	Aushub und Leitungsbau Meteorwasser
66	Aushub Betonmauer
67	Betonarbeiten (Bruss)
68	ES und KS versetzen
69	Werkleitungsarbeiten Fernwärme
70	Grabenauffüllung
71	Fundation einbauen
72	Randabschlüsse versetzen
73	Planie Strasse und Trottoir
74	Belagsarbeiten Trag-/Binderschicht, Strasse und Trottoir
75	Fertigstellungsarbeiten
76	**Etappe 3b (4705.30-4897.00)**
77	Installation / Abschrankung
78	Belag anschneiden und Abbrechen
79	best. Schächte abbrechen
80	Fundation abtragen
81	Aushub und Leitungsbau Meteorwasser
82	ES und KS versetzen
83	Werkleitungsarbeiten Wasser/ Swisscom
84	Grabenauffüllung
85	Fundation einbauen
86	Randabschlüsse versetzen
87	Planie Strasse
88	Belagsarbeiten Trag-/Binderschicht, Strasse und Trottoir
89	Fertigstellungsarbeiten
90	**Etappe 4a (4897.00-5053.00)**
91	Installation / Abschrankung
92	Belag anschneiden und Abbrechen
93	best. Schächte abbrechen
94	Fundation abtragen
95	Aushub und Leitungsbau Querungen Meteorwasser
96	Werkleitungsbau Querungen TV
97	ES und KS versetzen
98	Grabenauffüllung
99	Fundation einbauen
100	Randabschlüsse versetzen
101	Planie Strasse und Trottoir
102	Belagsarbeiten Trag-/Binderschicht, Strasse
103	Fertigstellungsarbeiten
104	**Etappe 4b (4897.00-5053.00)**
105	Installation / Abschrankung
106	Belag anschneiden und Abbrechen
107	best. Schächte abbrechen
108	Fundation abtragen
109	Aushub und Leitungsbau Meteorwasser
110	ES und KS versetzen
111	Werkleitungsarbeiten Wasser/ TV
112	Fundation einbauen
113	Randabschlüsse versetzen
114	Betonarbeiten Buchsteteile (Bruss)
115	Planie Strasse
116	Belagsarbeiten Trag-/Binderschicht Strasse und Trottoir
117	Fertigstellungsarbeiten
118	**Fertigstellungsarbeiten**
119	Rückbau Installationsplätze
120	**Deckbelagsarbeiten**
121	Installation
122	Rampen entfernen
123	Belag fräsen Ein- und Zufahrten Übergänge
124	Reinigung 1. Etappe
125	Haftvermittler/ Kalteinb. 1. Etappe
126	Deckbelag 1. Etappe
127	Reinigung 2. Etappe
128	Haftvermittler/ Kalteinb. 2. Etappe
129	Deckbelag 2. Etappe
130	Reinigung 3. Etappe
131	Haftvermittler/ Kalteinb. 3. Etappe
132	Deckbelag 3. Etappe
133	Reinigung 4. Etappe
134	Haftvermittler/ Kalteinb. 4. Etappe
135	Deckbelag 4. Etappe
136	Fertigstellungsarbeiten (Deckel ziehen)
